

Что построено и что делаем дальше

Сайт, CRM и закрытый контур — одна платформа, а не витрина отдельно и учёт отдельно. Серверная часть работает, сайт работает, они соединены между собой. Дальше — закрытый контур и переезд в облако.

СОСТОЯНИЕ

Из чего сегодня состоит продукт

11

модулей бэкенда

64

теста, все зелёные

3

двери наружу

12

позиций каталога

22


страницы сайта

42

документа ru + en

Два контура и шлюз между ними

Стандартные сервисы не переписываем, уникальную логику держим у себя. Почта и календарь покупные. CRM, документы и правила доступа — свои, потому что именно они и есть продукт.

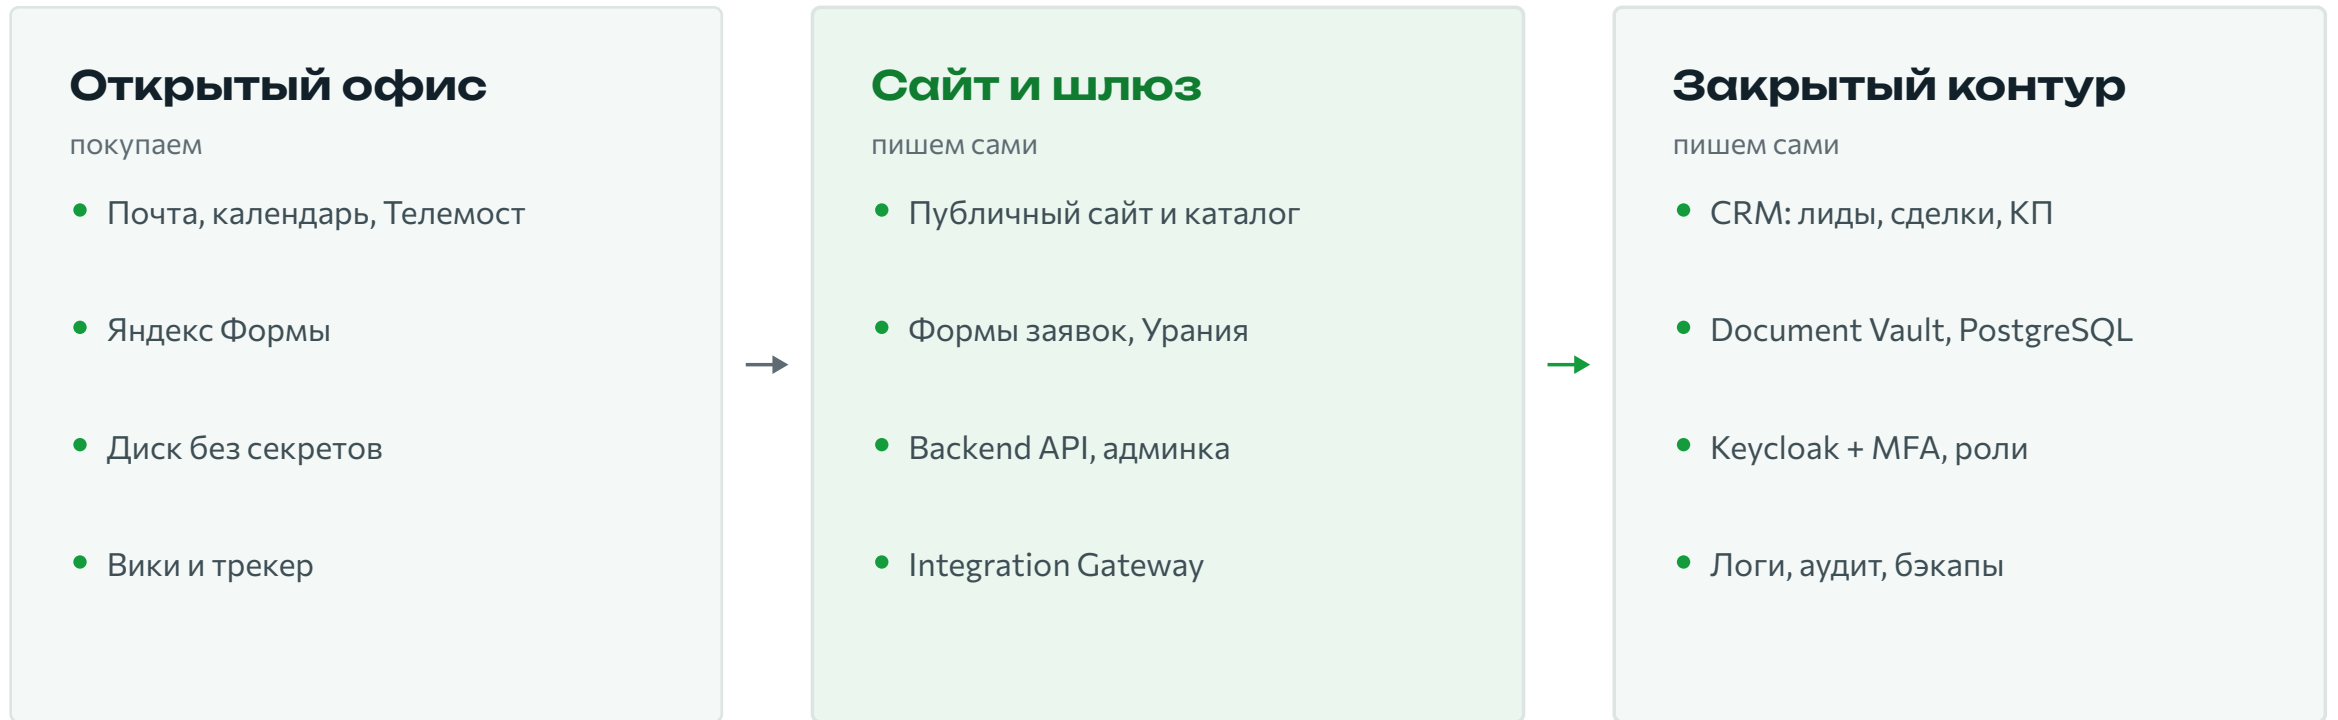

Единственный путь внутрь — через шлюз. Клиентская база, договоры и персональные данные наружу не выходят: обратно уезжает только согласованный документ или шаблонное письмо.

ПЕРИМЕТР

Три двери, и четвёртой не будет

Новая функция приезжает в одну из трёх. Тогда периметр проверяется в трёх местах, а не в тридцати контроллерах.

/api/public/v1/**

сборка сайта, Урания

Только чтение, только опубликованное, кэшируется на пять минут

/api/forms/v1/leads

формы сайта, почта


Единственная запись снаружи. Идемпотентность по ключу: повторный клик не создаёт вторую заявку

/admin/**

сотрудник

Сессия и роли. Закрывается целиком на прокси, код от выбора не зависит

Путь заявки — он же границы модулей

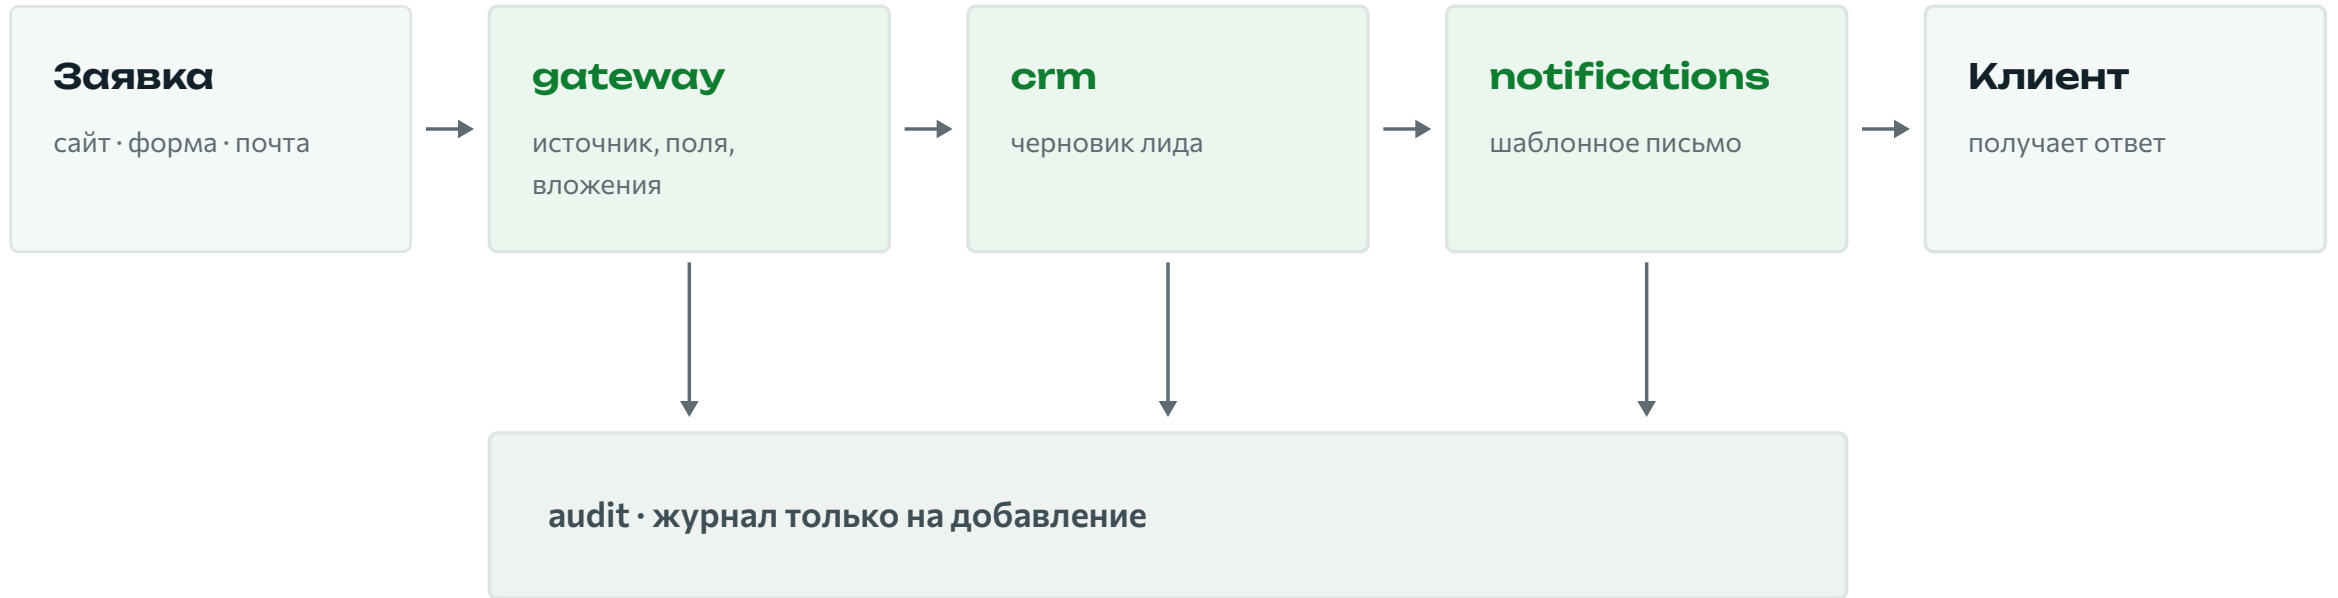

Запись в базу и событие коммитятся одной транзакцией, поэтому заявка не теряется, даже если письмо не ушло. Правку журнала задним числом запрещает триггер базы, а не дисциплина.

МОДУЛИ

Семь готовы целиком

Одно приложение, одна база. Модули — границы пакетов ru.vedal.portal.*, а не отдельные деплои: пятьдесят сотрудников не требуют микросервисов.

catalog

ГОТОВ

Продукция и категории, публичное API, правка и публикация в админке

content

ГОТОВ

Новости и пресс-центр. Пустая лента — нормальное состояние

documents

ГОТОВ

Перечень, статусы доступа, выдача файла за портом FileStorage

gateway

ГОТОВ

Приём заявок: проверка, honeypot, лимит частоты, идемпотентность

audit

ГОТОВ

Журнал только на добавление, правку запрещает триггер базы

common

ГОТОВ

Ошибки в одном формате, транзакционный outbox, лимиты

app

ГОТОВ

Сборка, четыре окружения, проверка переменных до старта, CORS

Четыре сделаны наполовину

crm

НАПОЛОВИНУ

Лиды принимаются и видны в админке.

Нет сделок, КП, статусов и ответственного

notifications

НАПОЛОВИНУ

Шаблоны, очередь и учёт доставки готовы.

Письма уходят в лог: SMTP Яндекс 360 не подключён

assistant

НАПОЛОВИНУ

Ограничения и передача человеку работают.

За портом LlmEngine поиск по словам, модели нет

iam

НАПОЛОВИНУ

Вход в админку на локальных учётках.

Keycloak и MFA ждут согласования закрытого контура

Плюс knowledge и vlm — AI-поиск по внутренним документам и визуальные модели для сервиса. Не начаты, это отдельные этапы роадмапа.

СДЕЛАНО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Сайт и бэкенд соединены

До этого обе половины были написаны по одной спеке, но между ними не было ни одного провода: формы никуда не отправлялись, Урания отвечала заготовками, каталог жил в файле фронтенда.

Чтение — на сборке

Каталог, новости и документы приходят из публичного API и обновляются раз в пять минут. Падение бэкенда не роняет уже собранный сайт.

Запись — из браузера

Формы уходят с ключом идемпотентности, Урания спрашивает Assistant API и показывает ссылки на источники.

Нет источников — нет ответа

Ассистент не придумывает. Когда подходящих опубликованных материалов нет, идёт передача человеку с контактами.

Фотографии — из MinIO

Медиа переехали в объектное хранилище. Локально MinIO, в облаке Yandex Object Storage: оба говорят на S3.

Что делаем дальше

01 Потребители событий переезжают в Kafka

БЭКЕНД

Публикация из outbox готова, топики заводит приложение. Осталось заставить потребителей читать из топиков, а не из процесса, и добавить очередь разбора для битых событий.

02 Keycloak и MFA вместо локальных учёток

БЭКЕНД

Вход строится на покупном провайдере идентичности, у нас остаётся модель ролей. Это условие для всего закрытого контура.

03 Документы в объектное хранилище

БЭКЕНД

MinIO уже поднят и медиа в нём. Осталось перевести туда документы: клиент на AWS SDK, приватный бакет, подписанные ссылки.

04 CRM целиком

БЭКЕНД

Клиенты, сделки, КП, статусы, ответственный, дилерская и сервисная воронки, аналитика по изделию и источнику.

Порядок не произвольный: каждый шаг оставляет работающее приложение.

Что делаем дальше

05 Живые письма и живая модель

Почта переключается на SMTP Яндекс 360. Урания получает YandexGPT и pgvector. Ограничения остаются в коде до вызова модели, а не в промпте.

БЭКЕНД

06 Пресс-центр, партнёры, SEO и аналитика

Двух страниц из карты сайта ещё нет. Плюс метаданные, разметка изделий, Яндекс Метрика и десять именованных событий — список уже согласован.

ФРОНТЕНД

07 Переезд в облако

VM, Managed PostgreSQL и Kafka, объектное хранилище, бэкапы с проверкой восстановления, мониторинг, сборка с деплоем.

ИНФРА

Последний шаг упирается в Yandex Cloud, которого пока нет: до него бэкенд живёт локально, а сайт остаётся статикой.

Как включиться

Поднять у себя

```
# база, брокер и хранилище
docker compose -f backend/compose.yaml up -d

# фотографии в хранилище
node backend/tools/upload-media.mjs

# бэкенд 8081, сайт 3000
cd backend && ./mvnw spring-boot:run
cd frontend && npm run dev
```

Нужны JDK 25, Node 24 и Docker. Тесты идут на настоящем PostgreSQL, поэтому Docker обязателен именно для них. Настройки сайта — frontend/.env.example.

Начинать читать — с docs/PROJECT.md. Там суть, архитектура, раскладка репозитория и открытые вопросы; остальные сорок документов — детализация. Документация ведётся парами ru и en с переключателем внутри файла.

Куда коммитить

back	серверная логика, тесты бэкенда
front	клиент, стили, тесты фронтенда
db	миграции, SQL, seed-данные
infra	сборка, CI/CD, Docker, зависимости
docs	документация и спеки
dev	интеграция, всё тестируется вместе
main	только протестированное

Коммиты — Conventional Commits с префиксом слоя. Мерж в dev с флагом --no-ff. В main — только после зелёных тестов.

Риски и чего ждём

Расхождения в документах

Пять штук, каждое зафиксировано как нерешённое: 50 или 60 сотрудников, Kafka или Redis, своя CRM или коробочная, «около десяти» или тринадцать изделий.

Данных по продукции нет

Датащитами подтверждены три позиции из двенадцати. Статус регистрации не подтверждён ни у одной, фотографий отдельными файлами нет.

Облака нет

Всё, что упирается в Yandex Cloud, стоит: Managed PostgreSQL и Kafka, бэкапы, мониторинг, развёртывание. Бэкенд пока живёт локально.

Ждут подтверждения

Допустимая потеря данных и время подъёма, срок хранения заявок, закрывать ли админку по сети, когда подключаем Keycloak.
